Kumskjema overvannskum

Prosjekt: VA-NORM

Harstad Kommune
Drift- og utbyggingstjenesten

Kum nr:	**O1**	Dato: 27.08.2019	Revidert: 08.06.2020
Type kum:	**Overvannskum**	Sign: sarren	
Se tegning:	**H 32**	Kontr: ahd	

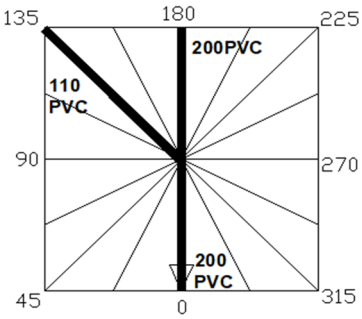

Kote topp kumlokk	35,0	Kontrolleres av entreprenør
Kote bunn kum	32,33	
Godstykkelse bunn	0,15	
Totalhøyde av kum	**2,82**	
Beregnet kote UK kum	32,18	Kontrolleres av entreprenør

Anmerkninger:

MATERIALLISTE:

Kumdeler

Produkt	Betegnelse	Stk	Byggehøyde (mm)	Anmerkning
Bunnseksjon	Basal el. tilsv.	1		
Kumringer	DN1000			
Kumringer	DN1000			
Kumringer	DN1000			
Kjegle	DN1000/650	1		m/ eksentrisk mannhull
Teleskopring	Skjæveland nr. 2186446 el. tilsv. H=250	1	150	100 mm ned i topplate/kjegletopp
Lokk av duktilt støpejern	Furnes 2116 med SORT slissepakning, el. tilsv.	1		m/ kommunevåpen og lås. Pinnesikre
Ramme av duktilt støpejern	NS1990 SJK m/ kontrollåpning i skjørt	1	30	
	Konstruksjonshøyde:			

Kumringer tilpasses byggehøyde

Rørdeler

Produkt	Betegnelse	Stk	Anmerkning
Bend	Langbend 30 grader	1	
Grenrør			
Dim. Overgang plast			
Propp			
Betong-plast overgang			
Spissvender			
Kjerneboring			
Rørgjennomføring			

Diverse deler

Produkt	Betegnelse	Stk	Anmerkning
Kumstige	Alustar el. Tilsv.	1	
